

Comité Directivo No. 14


Conversión CMS a V+

09/11/2023

Proyecto Fiserv - Time Line

After Remediation Plan
Plan 72% Real 62%
Desv **10%**

Finalizado Pendientes

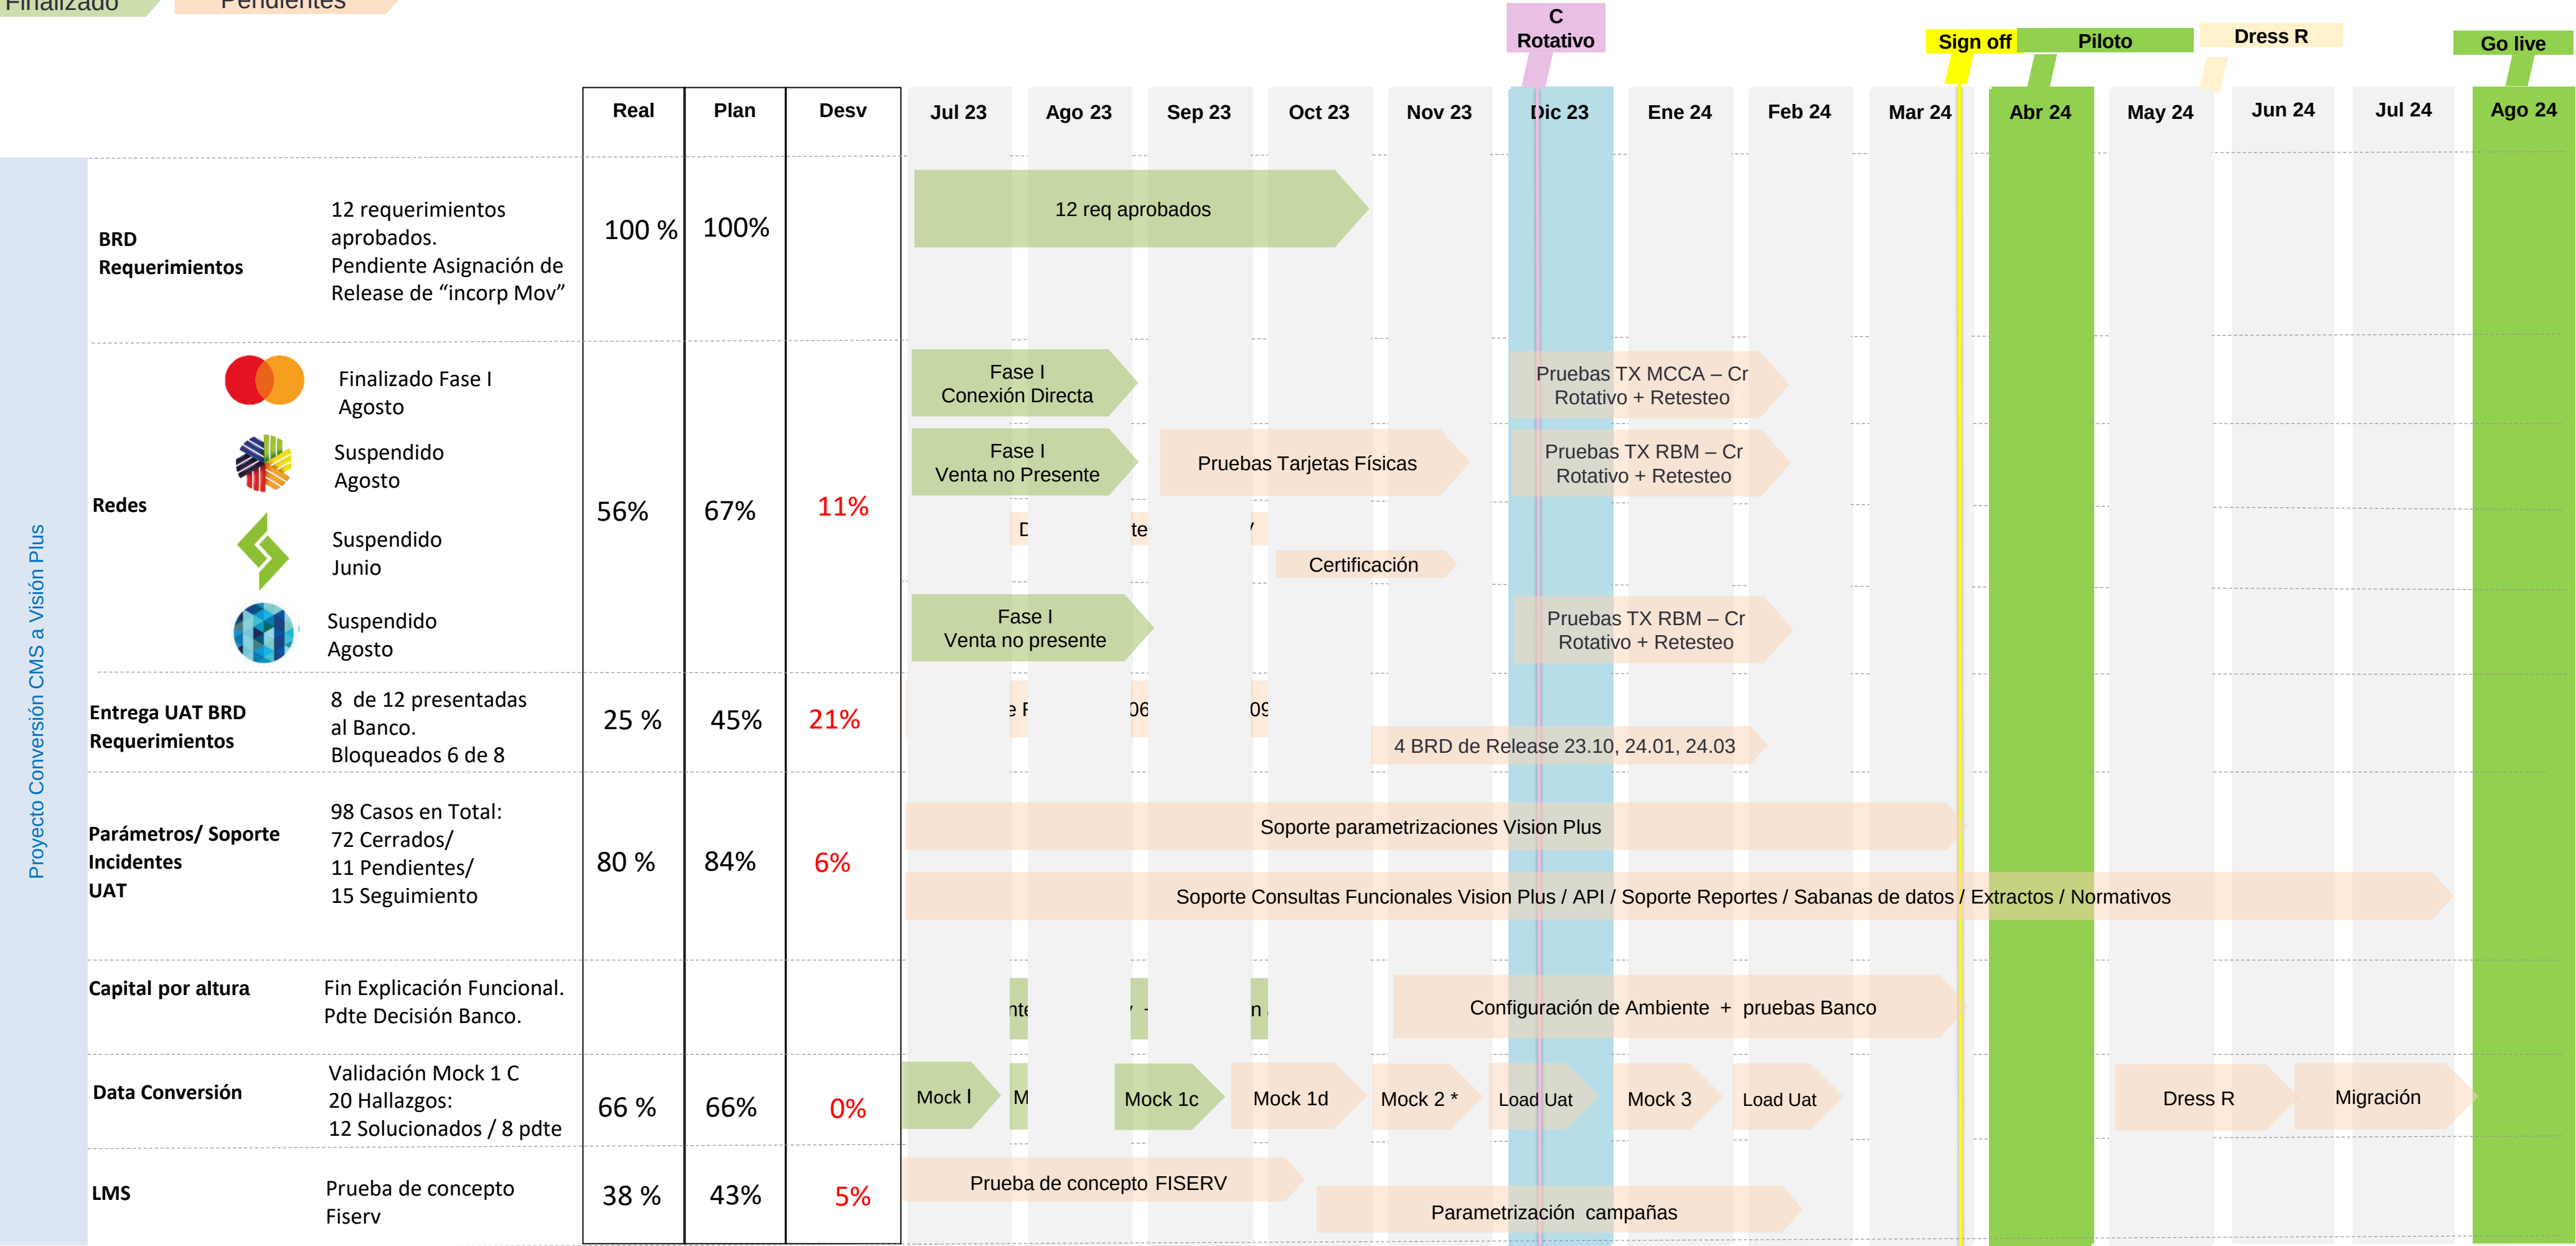


Resultados Pruebas UAT - BRD's																Pendientes		En curso		Finalizado	
BRD	2023						2024								Status	% Pruebas Técnicas	% Pruebas Funcional	Resp	OBS		
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago							
Integracion Monitor Plus - B24	Fase I Venta no presente					Fase II. Advice, venta presente									Fin Fase I	N/A	Fase II 0%		En espera Retesteo		
Servibanca process	Desarrollos internos FISERV			Certificación Pruebas Banco											Suspendido	0%	0%	Fiserv	Mac		
API-Cashin (Sin Validaciones)		Entregado- En revisión incidentes BAU													Bloqueado	100%	95%	Fiserv	Incidente		
Embossed Name Inverted			Entregado - En revisión por arquitectura Fiserv												Bloqueado	N/A	18%	Fiserv	CH pend		
API - Online Embossing			Entregado - En revisión incidente cuenta activa												Bloqueado		0%	Fiserv	CH Pend		
Recovery Fee/Change request (Gastos de Cobranzas)				Entregado- Pdte parám y Capital por Altura												Bloqueado	N/A	0%	Fiserv	Parametr	
Membership (Cuota de Manejo)				Entregado - en pruebas Banco												Diseño	N/A	0%	Banco		
API-Cashin (Con Validaciones)					Pendiente entrega 23.10										Pdte entreg			Fiserv	Retrasado		
Crédito Rotativo						Pendiente entrega 24.01									Pdte entreg			Fiserv			
Autorizaciones Tarjeta privada olímpica						Pendiente entrega 24.01									Pdte entreg			Fiserv			
Incorporación de movimientos							Pendiente Definición de Release								Pdte entreg			Fiserv			

Proyección y Consumo Mensual de Horas: Proyección al 27 de Septiembre

Over lap Hours

Total Proyecto 35.731 = 18.999 + 16.732

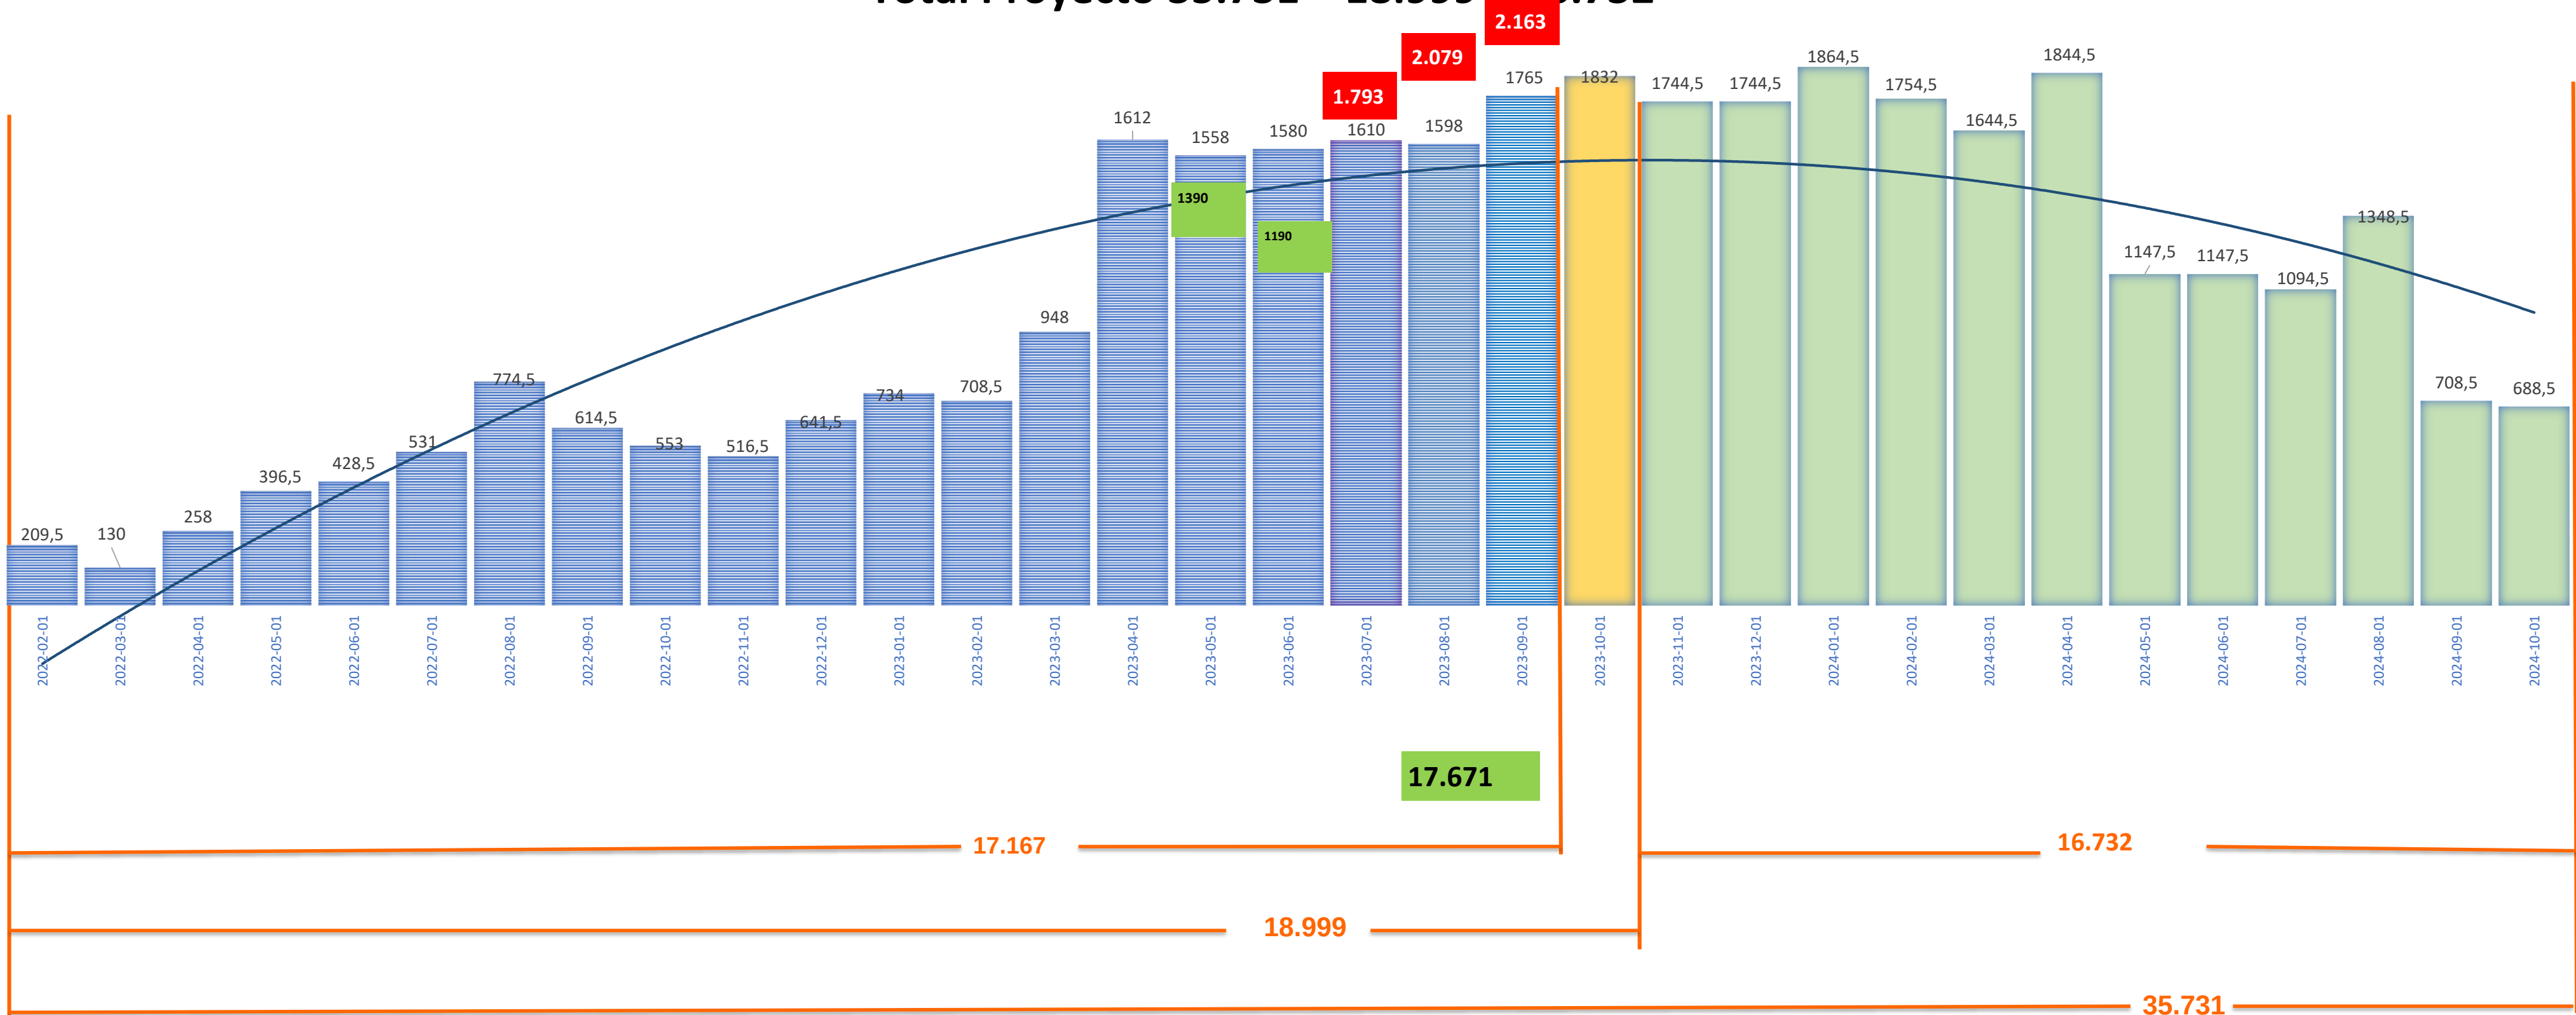

A thick red curved line starts from the top left, arches over the top of the slide, and ends at the top right.

Gracias.

Ser^{Banco}**finanza**
